
MẶT BẰNG ĐÀO ĐẤT - LẤP VĂNG LỚP 2 | THEO DÕI TIẾN ĐỘ

COS LỚP 1: -3.5M
COS LỚP 2: -6.9M

47,760 M3 (ĐÃ NHÂN HS 1.2) | MỖI ZONE 5300 M3 | TỔNG THỜI GIAN ĐÀO ĐẤT: 10/27/2026 11/9/2026 13 NGÀY

TỔNG THI CÔNG LỚP 2 | BẮT ĐẦU 10/27/2026 | KẾT THÚC 11/17/2026 | 21 NGÀY

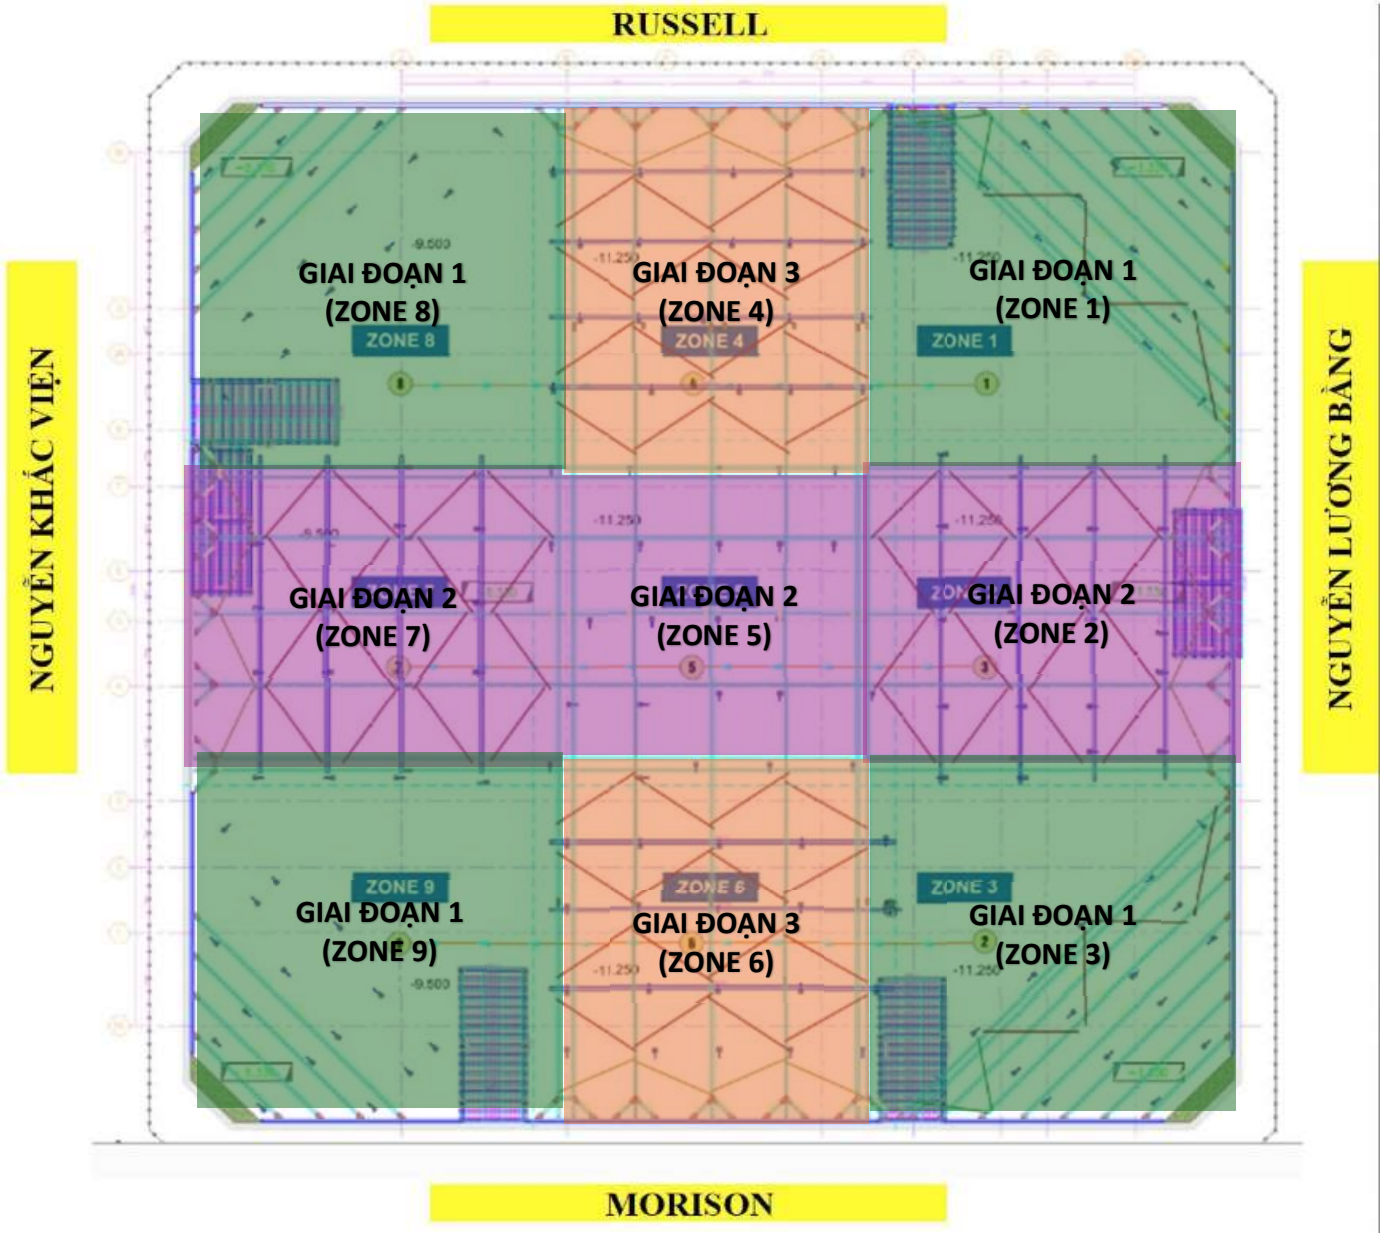

ZONE 1	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC
Đào lớp 2	10/28/2026	11/1/2026
Lắp văn biên	10/30/2026	11/2/2026
Hoàn thiện văng	11/2/2026	11/7/2026
Đổ chèn + sàn biện pháp	11/2/2026	11/5/2026
Kích	11/8/2026	11/9/2026

ZONE 3	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC
Đào lớp 2	10/27/2026	10/31/2026
Lắp văn biên	10/29/2026	11/1/2026
Hoàn thiện văng	11/2/2026	11/7/2026
Đổ chèn + sàn biện pháp	11/1/2026	11/4/2026
Kích	11/8/2026	11/9/2026

ZONE 8	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC
Đào lớp 2	10/28/2026	11/1/2026
Lắp văn biên	10/30/2026	11/2/2026
Hoàn thiện văng	11/2/2026	11/7/2026
Đổ chèn + sàn biện pháp	11/2/2026	11/5/2026
Kích	11/8/2026	11/9/2026

ZONE 9	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC
Đào lớp 2	10/27/2026	10/31/2026
Lắp văn biên	10/29/2026	11/1/2026
Hoàn thiện văng	11/2/2026	11/7/2026
Đổ chèn + sàn biện pháp	11/1/2026	11/4/2026
Kích	11/8/2026	11/9/2026

ZONE 2	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC
Đào lớp 2	11/2/2026	11/6/2026
Lắp văn biên	11/4/2026	11/7/2026
Hoàn thiện văng	11/7/2026	11/12/2026
Đổ chèn + sàn biện pháp	11/7/2026	11/10/2026
Kích	11/13/2026	11/14/2026

ZONE 5	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC
Đào lớp 2	11/2/2026	11/6/2026
Lắp văn biên	11/4/2026	11/7/2026
Hoàn thiện văng	11/7/2026	11/12/2026
Đổ chèn + sàn biện pháp	11/7/2026	11/10/2026
Kích	11/13/2026	11/14/2026

ZONE 7	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC
Đào lớp 2	11/2/2026	11/6/2026
Lắp văn biên	11/4/2026	11/7/2026
Hoàn thiện văng	11/7/2026	11/12/2026
Đổ chèn + sàn biện pháp	11/7/2026	11/11/2026
Kích	11/13/2026	11/14/2026

ZONE 4	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC
Đào lớp 2	11/7/2026	11/9/2026
Lắp văn biên	11/7/2026	11/10/2026
Hoàn thiện văng	11/10/2026	11/15/2026
Đổ chèn + sàn biện ph	11/10/2026	11/14/2026
Kích	11/16/2026	11/17/2026

ZONE 5	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC
Đào lớp 2	11/7/2026	11/9/2026
Lắp văn biên	11/7/2026	11/10/2026
Hoàn thiện văng	11/10/2026	11/15/2026
Đổ chèn + sàn biện pháp	11/10/2026	11/14/2026
Kích	11/16/2026	11/17/2026
